

宮城県大河原土木事務所

【説明資料】

- ・ 東日本台風からの復旧・復興進捗状況
- ・ 砂防事業
- ・ 雉子尾川大規模特定河川事業

令和6年1月29日



大河原土木事務所

令和元年東日本台風からの復旧・復興事業の進捗状況

【令和6年1月末現在】

公共土木施設 着手率 完成率
(道路、河川、砂防、受託) 100% 99%

着手率
完成率

50% 100%

323箇所
320箇所

復旧・復興事業の概要
期 間 R1～R4年度
工事費 約151億円

事業箇所数:
323箇所

項目

(着手・完成箇所数)
／(被災箇所数)

項目

(着手・完成箇所数)
／(被災箇所数)

項目

(着手・完成箇所数)
／(被災箇所数)

道路
災害復旧工事

着手率
完成率

93箇所
93箇所

50% 100%

期 間 R1～R3
工事費 約40億円

着手率 100% 完成率 100%

事業箇所数: 93箇所

※ 丸森霊山線・丸森梁川線の
一部は関連工事との調整により
R4完成見込

災害関連
緊急砂防工事

着手率
完成率

15箇所
12箇所

50% 100%

期 間 R1～R4
工事費 約52億円

着手率 100% 完成率 80%

事業箇所数: 15箇所

受託工事
(町道古田峠線)

着手率
完成率

7箇所
7箇所

50% 100%

期 間 R1～R3
工事費 約2億円

着手率 100% 完成率 100%

事業箇所数: 7箇所

河川
災害復旧工事

着手率
完成率

193箇所
193箇所

50% 100%

期 間 R1～R3
工事費 約50億円

着手率 100% 完成率 100%

事業箇所数: 193箇所

災害関連工事
(丸森梁川線)

着手率
完成率

1箇所
1箇所

50% 100%

期 間 R1～R4
工事費 約4億円

着手率 100% 完成率 100%

事業箇所数: 1箇所

土砂災害
対策道路事業
(丸森霊山線)

着手率
完成率

14箇所
14箇所

50% 100%

期 間 R3～R4
工事費 約3億円

着手率 100% 完成率 100%


事業箇所数: 14箇所

阿武隈川流域 災害関連緊急砂防事業の進捗状況について (1/2)

大河原土木事務所

宮城県実施箇所位置図：15箇所

(令和6年1月末)

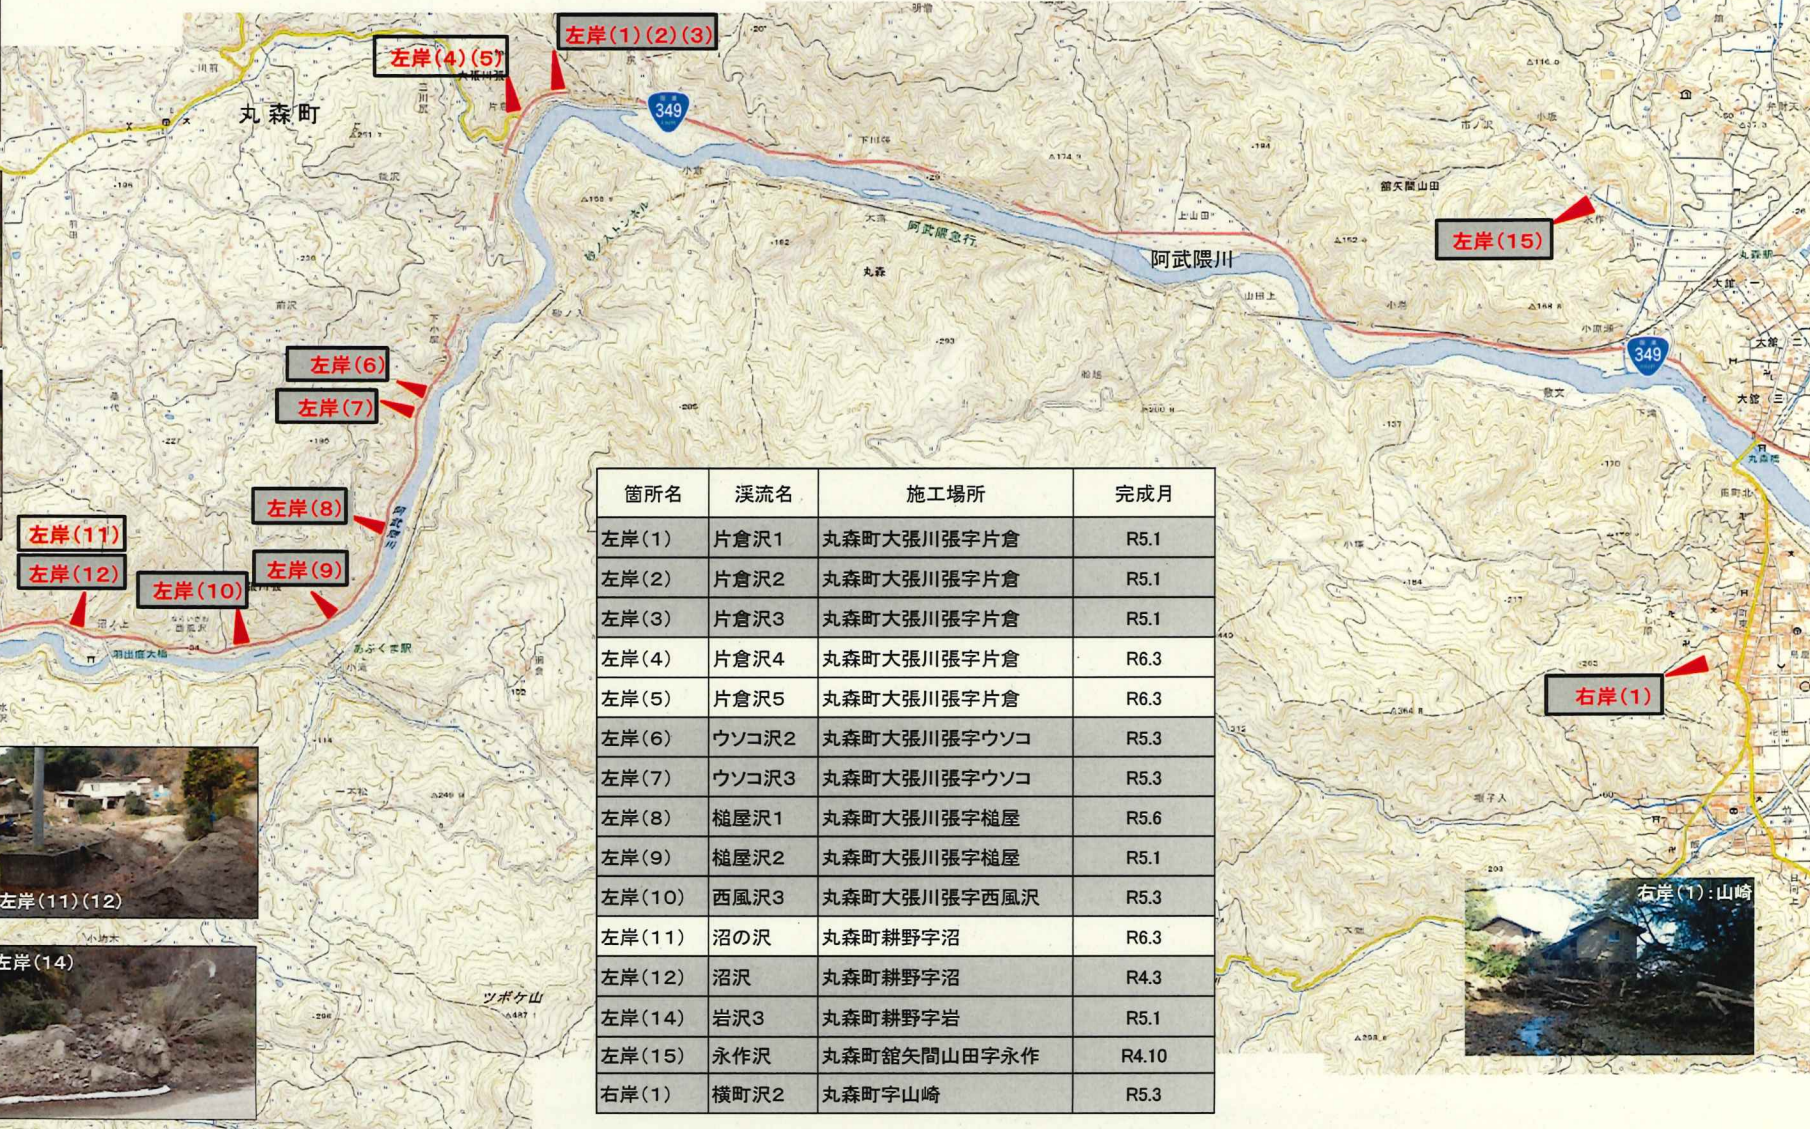

左岸(14)

左岸(11)(12)


左岸(14)

右岸(1)

右岸(1):山崎

箇所名	溪流名	施工場所	完成月
左岸(1)	片倉沢1	丸森町大張川張字片倉	R5.1
左岸(2)	片倉沢2	丸森町大張川張字片倉	R5.1
左岸(3)	片倉沢3	丸森町大張川張字片倉	R5.1
左岸(4)	片倉沢4	丸森町大張川張字片倉	R6.3
左岸(5)	片倉沢5	丸森町大張川張字片倉	R6.3
左岸(6)	ウソ沢2	丸森町大張川張字ウソ	R5.3
左岸(7)	ウソ沢3	丸森町大張川張字ウソ	R5.3
左岸(8)	槌屋沢1	丸森町大張川張字槌屋	R5.6
左岸(9)	槌屋沢2	丸森町大張川張字槌屋	R5.1
左岸(10)	西風沢3	丸森町大張川張字西風	R5.3
左岸(11)	沼の沢	丸森町耕野字沼	R6.3
左岸(12)	沼沢	丸森町耕野字沼	R4.3
左岸(14)	岩沢3	丸森町耕野字岩	R5.1
左岸(15)	永作沢	丸森町館矢間山田字永作	R4.10
右岸(1)	横町沢2	丸森町字山崎	R5.3

左岸 (4)

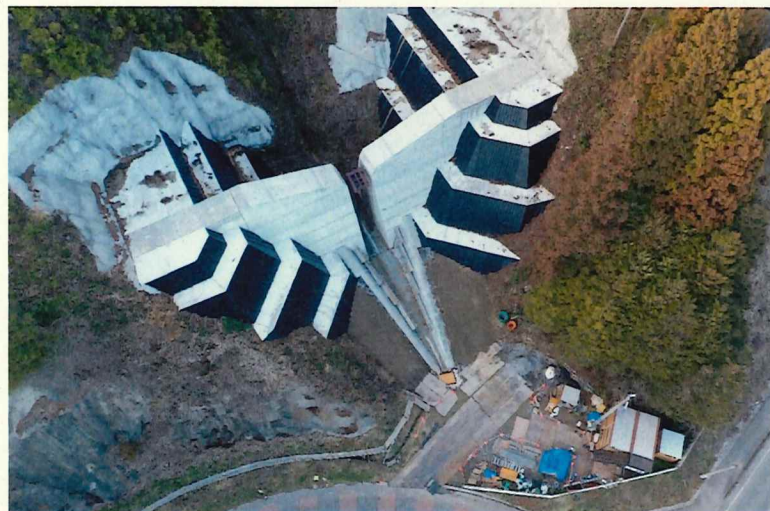


流路工 (擦付護岸工)

左岸 (5)



流路工 (床固め、擦付護岸工)

左岸 (11)

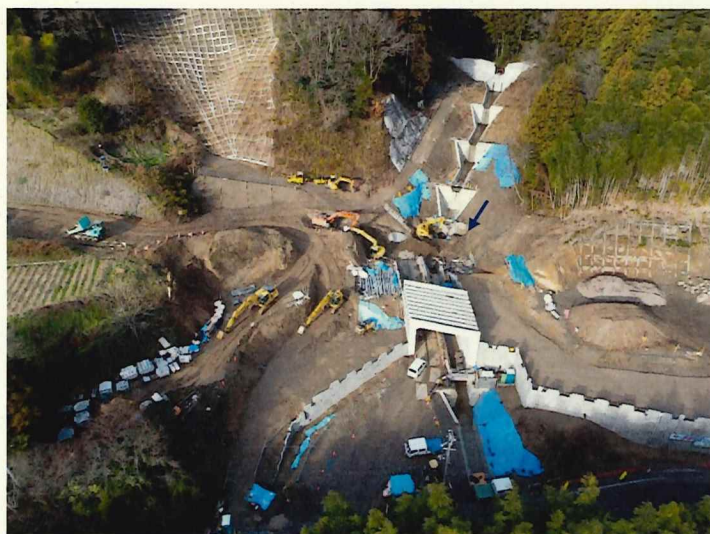


流路工 (床固め、擦付護岸工)



一級河川阿武隈川水系雫子尾川 大規模特定河川事業

令和6年1月29日
宮城県大河原土木事務所

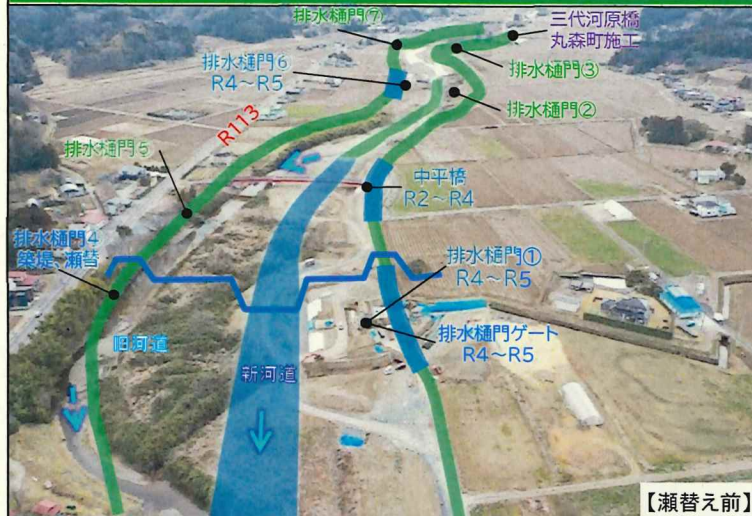

大規模特定河川事業

- 事業期間: R2~R9(予定)
- 全体延長 L=1.6km(石神橋~三代河原橋)

【R2~R5完成工事】


- ・中平橋下部工事(R3.6.18完成)
- ・中平橋取付道路工事(R4.12.22完成)
- ・中平橋上部工事(R5.3.24完成)
- ・排水樋門工事⑥(R5.6.22完成)
- ・排水樋門ゲート工事(R5.7.26完成)
- ・排水樋門工事①(R5.8.22完成)

【実施中】

- ・排水樋門工事④ 奥田建設(株)
R5.6.30~R6.3.29(予定)

【審査中】

- ・排水樋門ゲート工事④
契約日の翌日~R6.9.30(予定)

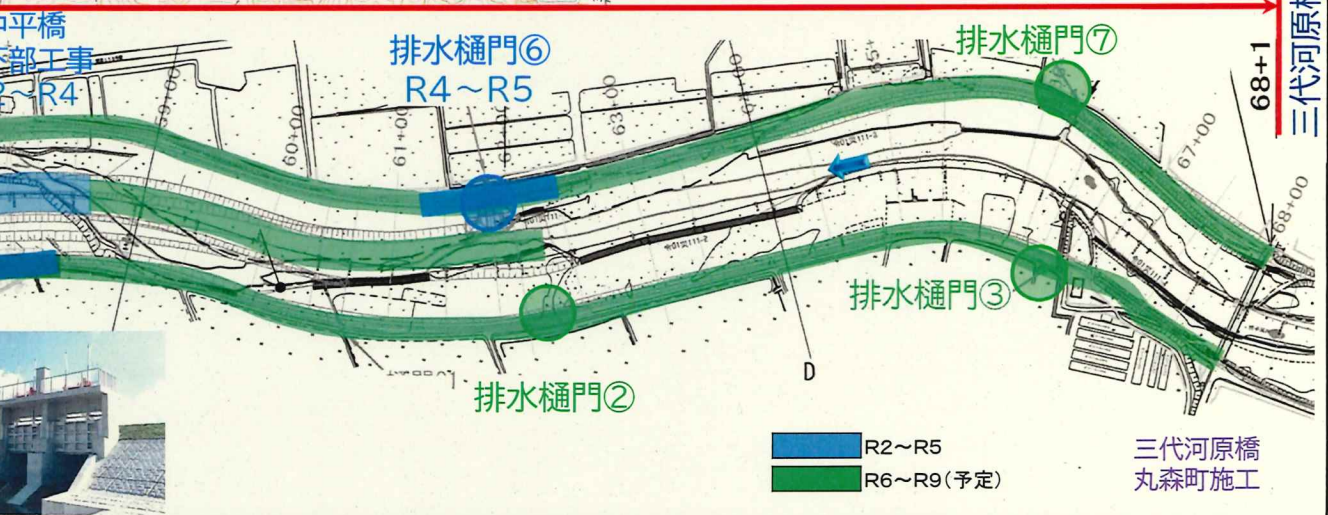

■ R2~R5
■ R6~R9(予定)

三代河原橋
丸森町施工
