


取り扱い注意

- 内川・新川・五福谷川 -

R6.3月末時点(見込み)

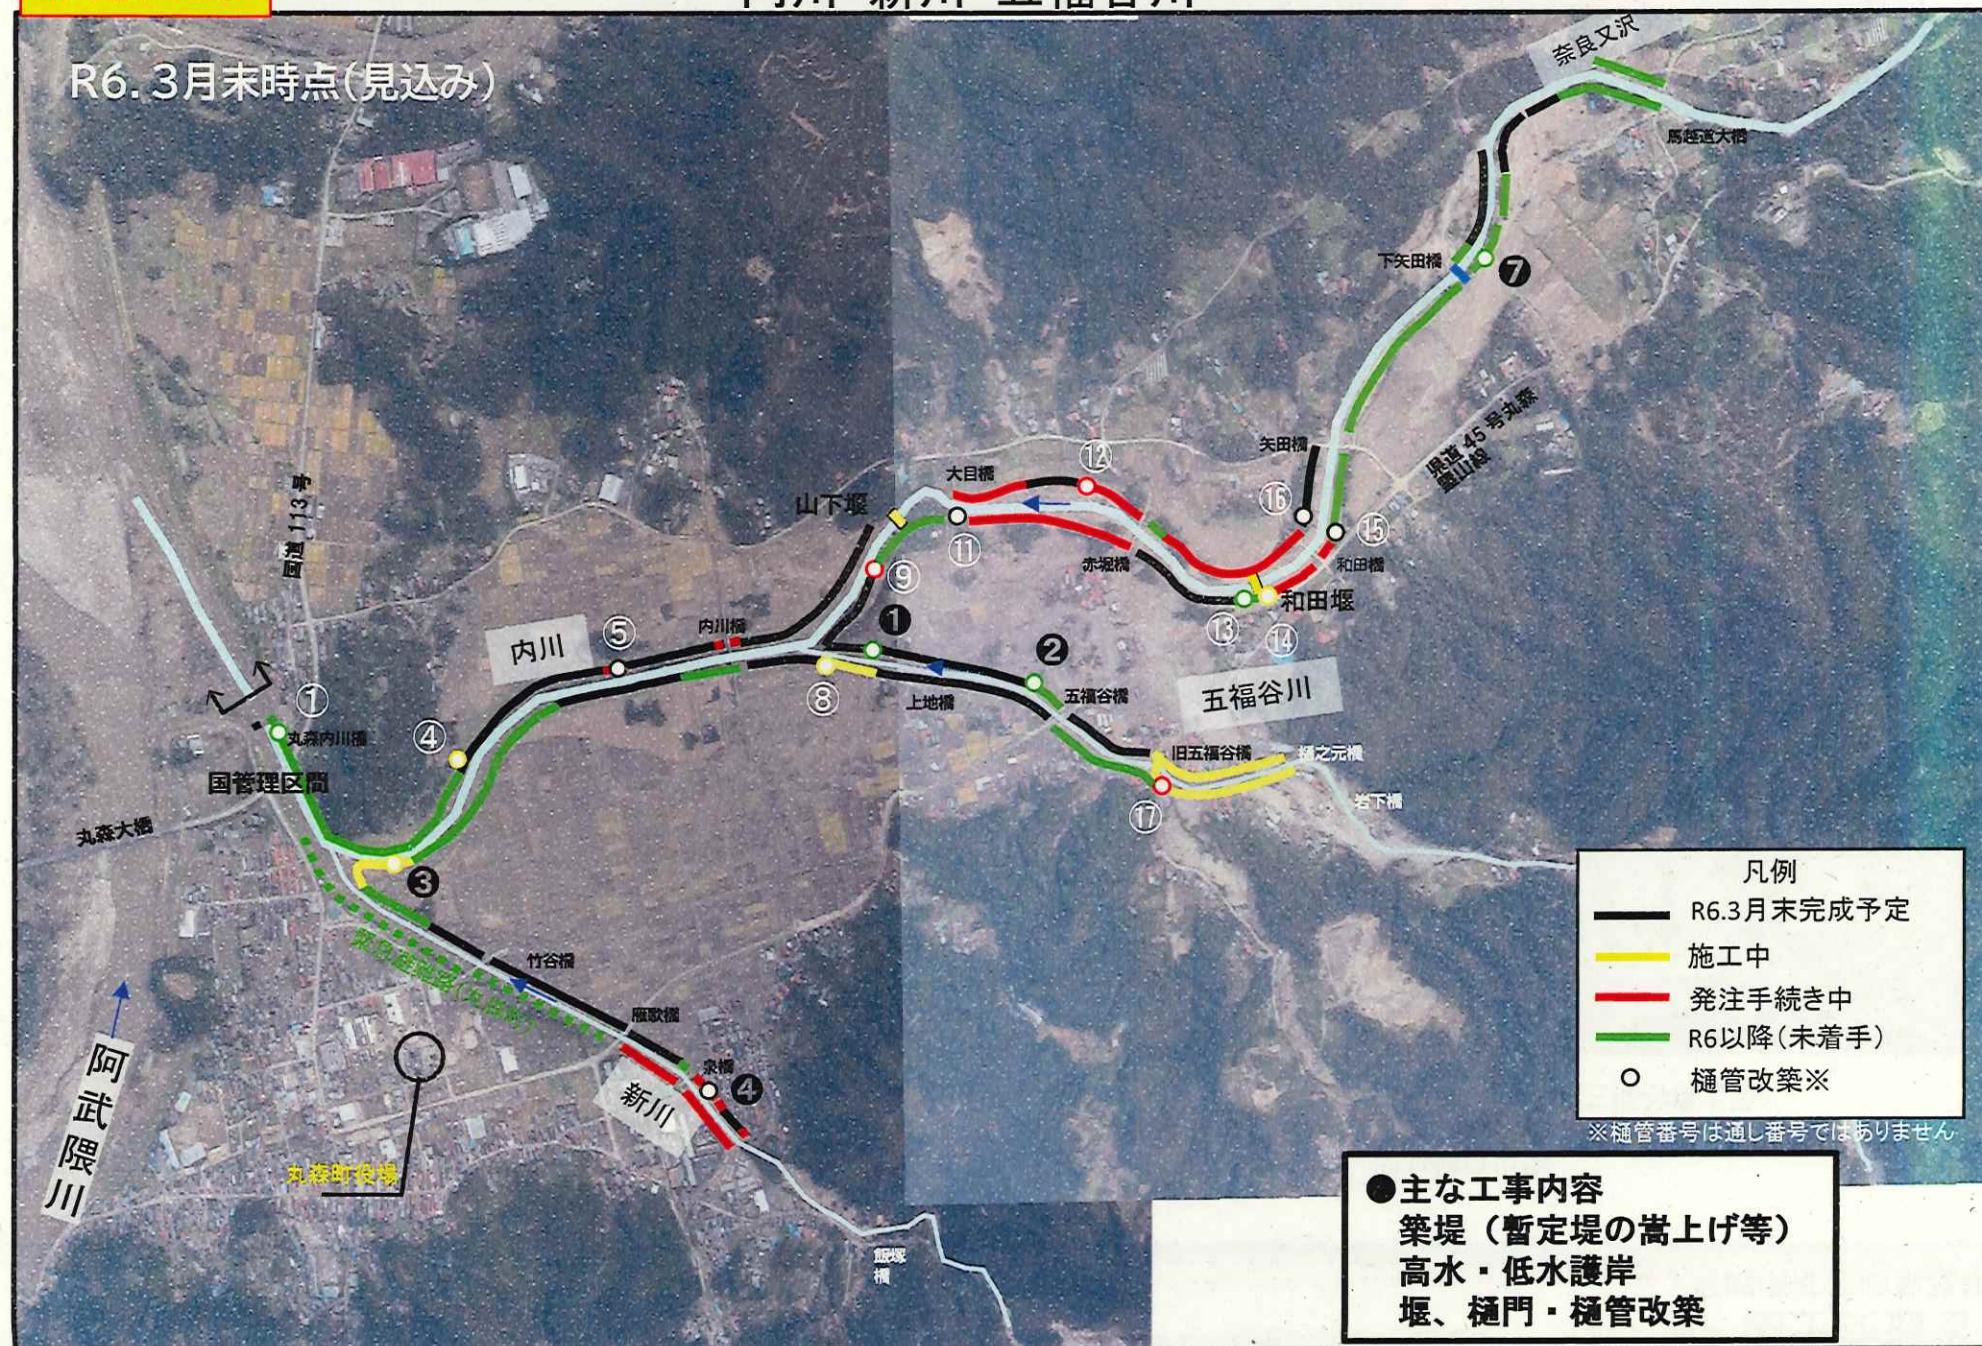

2024年1月26日(金)時点

内川流域山下堰
山下堰(右岸) 仮設工 施工中
〈大目橋下流〉



内川流域和田堰 (左岸)
和田堰(左岸) 構造物撤去工 施工中
〈和田橋下流〉



旧五福谷川橋
旧橋撤去工 施工中
〈旧五福谷橋上流〉



樋管③
樋管本体工 施工中
〈内川・新川合流点〉



内川
法覆護岸工・導水路工 施工中
〈矢田橋上流〉




新川
河川土工 施工中
〈泉橋上流〉



2024年1月26日(金)時点

取り扱い注意

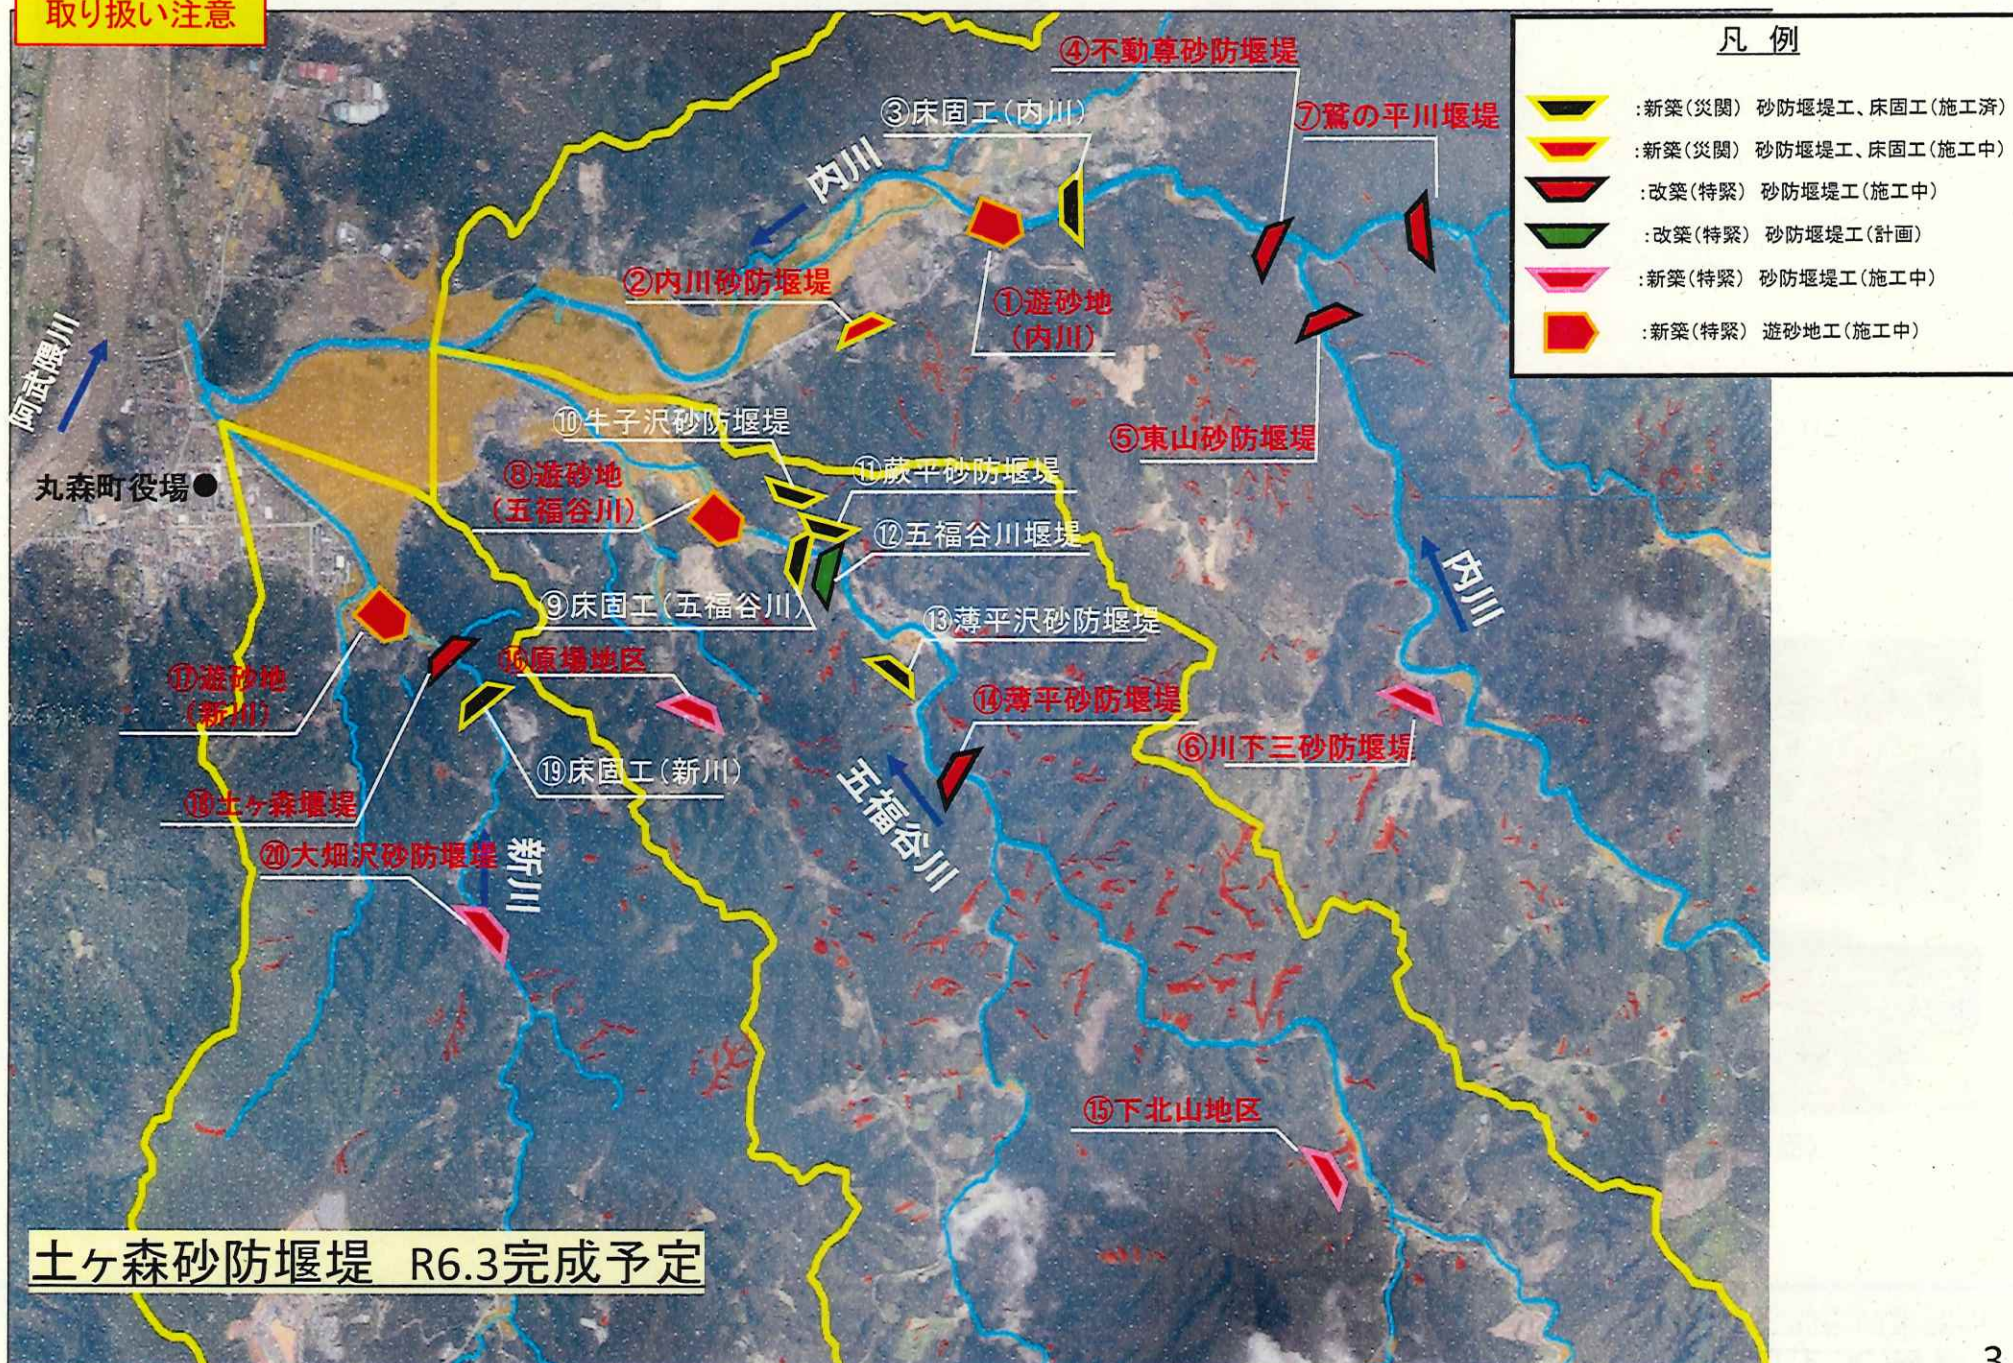

①内川遊砂地
護岸工 積ブロック 堰堤部掘削
〈内川遊砂地 下流〉



②内川砂防堰堤
砂防土工 掘削
〈内川砂防堰堤 下流〉



④不動尊砂防堰堤
型枠組立・コンクリート打設
〈不動尊砂防堰堤 上空〉



⑤東山砂防堰堤
型枠組立・コンクリート打設
〈東山砂防堰堤 上流〉



⑥川下三砂防堰堤
型枠組立・コンクリート打設
〈川下三砂防堰堤 上空〉



⑧-1五福谷川遊砂地
流路工 流路掘削
〈五福谷川遊砂地 下流〉



⑧-2岩下橋下部工
仮橋架設完了
〈岩下橋 上流〉



⑧-3樋之元橋下部工
橋台完成
〈樋之元橋 上空〉



⑭薄平砂防堰堤
法面工 フレーム組立 主堰堤 差筋削工
〈薄平砂防堰堤 上空〉



⑮下北山砂防堰堤
型枠組立・コンクリート打設
〈下北山砂防堰堤 上空〉



⑯原場砂防堰堤
管理用道路 法面工 吹付枠設置
〈原場砂防堰堤 上空〉



2024年1月26日(金)時点

⑰-1新川遊砂地
5号帯工 型枠組立・コンクリート打設
〈新川遊砂地 下流〉



⑰-2飯塚橋下部工
型枠組立・コンクリート打設
〈飯塚橋 上空〉



⑱土ヶ森砂防堰堤
垂直壁 型枠組立・コンクリート打設
〈土ヶ森砂防堰堤 上流〉



⑳大畑沢砂防堰堤
型枠組立・コンクリート打設
〈大畑沢砂防堰堤 上空〉



国道349号 山側への別ルート(別線整備) R6.1.4時点 工事状況図<計15件>

令和6年1月上旬時点

<区 間> (起点)宮城県伊具郡丸森町耕野不動 ~ (終点)宮城県伊具郡丸森町大張川張
 <延 長> 6km
 <構造規格等> 第3種第3級 設計速度50km/h
 <計画交通量> 1,700台/日
 <構造物延長> 約4,128m (うち、橋梁357m トンネル3,771m)
 <構造物比率> 約69%

《受託工事》R5~6(国) 五十沢地区構造物工事<榑本間組>
 契約工期: R5. 6. 23 ~ R6. 12. 23
 工事内容: 道路土工、補強土壁

R5-6(国) 丸森第1号橋床板工工事<熱海建設<榑>
 契約工期: R5. 9. 22 ~ R6. 9. 27
 工事内容: 第1号橋床板工

R3-6(国) 丸森第3号トンネル工事<前田建設工業<榑>
 契約工期: R4. 3. 9 ~ R6. 8. 5
 工事内容: 第3号トンネル L=1,893m、道路改良

R4(翌) 不動地区構造物工事<千田建設<榑>
 契約工期: R5. 4. 17 ~ R6. 3. 22
 工事内容: 道路土工、補強土壁

R4-6(国) 国道349号 丸森第2号トンネル工事<榑不動テトラ>
 契約工期: R5. 3. 15 ~ R6. 5. 29
 工事内容: 第2号トンネル L=257m、道路改良

R5~6(国) 丸森地区構造物工事にりんかい日産建設<榑>
 契約工期: R5. 11. 28 ~ R6. 11. 29
 工事内容: 道路土工、補強土壁

R5-6(国) 丸森第2号橋床板工工事<丸か建設<榑>
 契約工期: R5. 8. 25 ~ R6. 6. 17
 工事内容: 第2号橋床板工

R3-6(国) 丸森第1号トンネル工事<佐藤工業<榑>
 契約工期: R4. 3. 8 ~ R6. 10. 11
 工事内容: 第1号トンネル L=762m、道路改良

R5-6(国) 丸森地区トンネルラジオ再放送設備工事<東芝テリー<榑>
 契約工期: R5. 11. 8 ~ R7. 2. 28
 工事内容: ラジオ再放送設備設置工

R5-6(国) 丸森地区トンネル非常設備工事<榑TTK>
 契約工期: R5. 11. 8 ~ R7. 2. 28
 工事内容: トンネル非常設備設置工

R5-6(国) 丸森第1号トンネル外照明設備工事<榑TTK>
 契約工期: R5. 9. 8 ~ R7. 2. 28
 工事内容: 1号、2号トンネル照明設備工

R5-6(国) 丸森第3号トンネル照明設備工事<栗原工業<榑>
 契約工期: R5. 9. 8 ~ R7. 2. 28
 工事内容: 3号トンネル照明設備工

R4(翌) 館地区道路改良工事<榑本田組>
 契約工期: R5. 4. 17 ~ R6. 3. 1
 工事内容: 道路土工、舗装

R4(翌) 沼地区構造物工事(その1) <熱海建設<榑>
 契約工期: R5. 4. 17 ~ R6. 3. 6
 工事内容: 道路土工、補強土壁


R4(翌) 沼地区構造物工事(その2) <榑橋本店>
 契約工期: R5. 4. 17 ~ R6. 2. 16
 工事内容: 道路土工、補強土壁

凡 例

□: 台風19号浸水範囲
 ■: 台風19号被災箇所
 ■: 県立自然公園(第3種特別地域)

— (国交省施行) 山側への別ルート 6.0km
 — (福島県から受託工事により、国交省施工) 兜橋~県境部区間 0.3km

※赤字: 前回からの新規契約工事

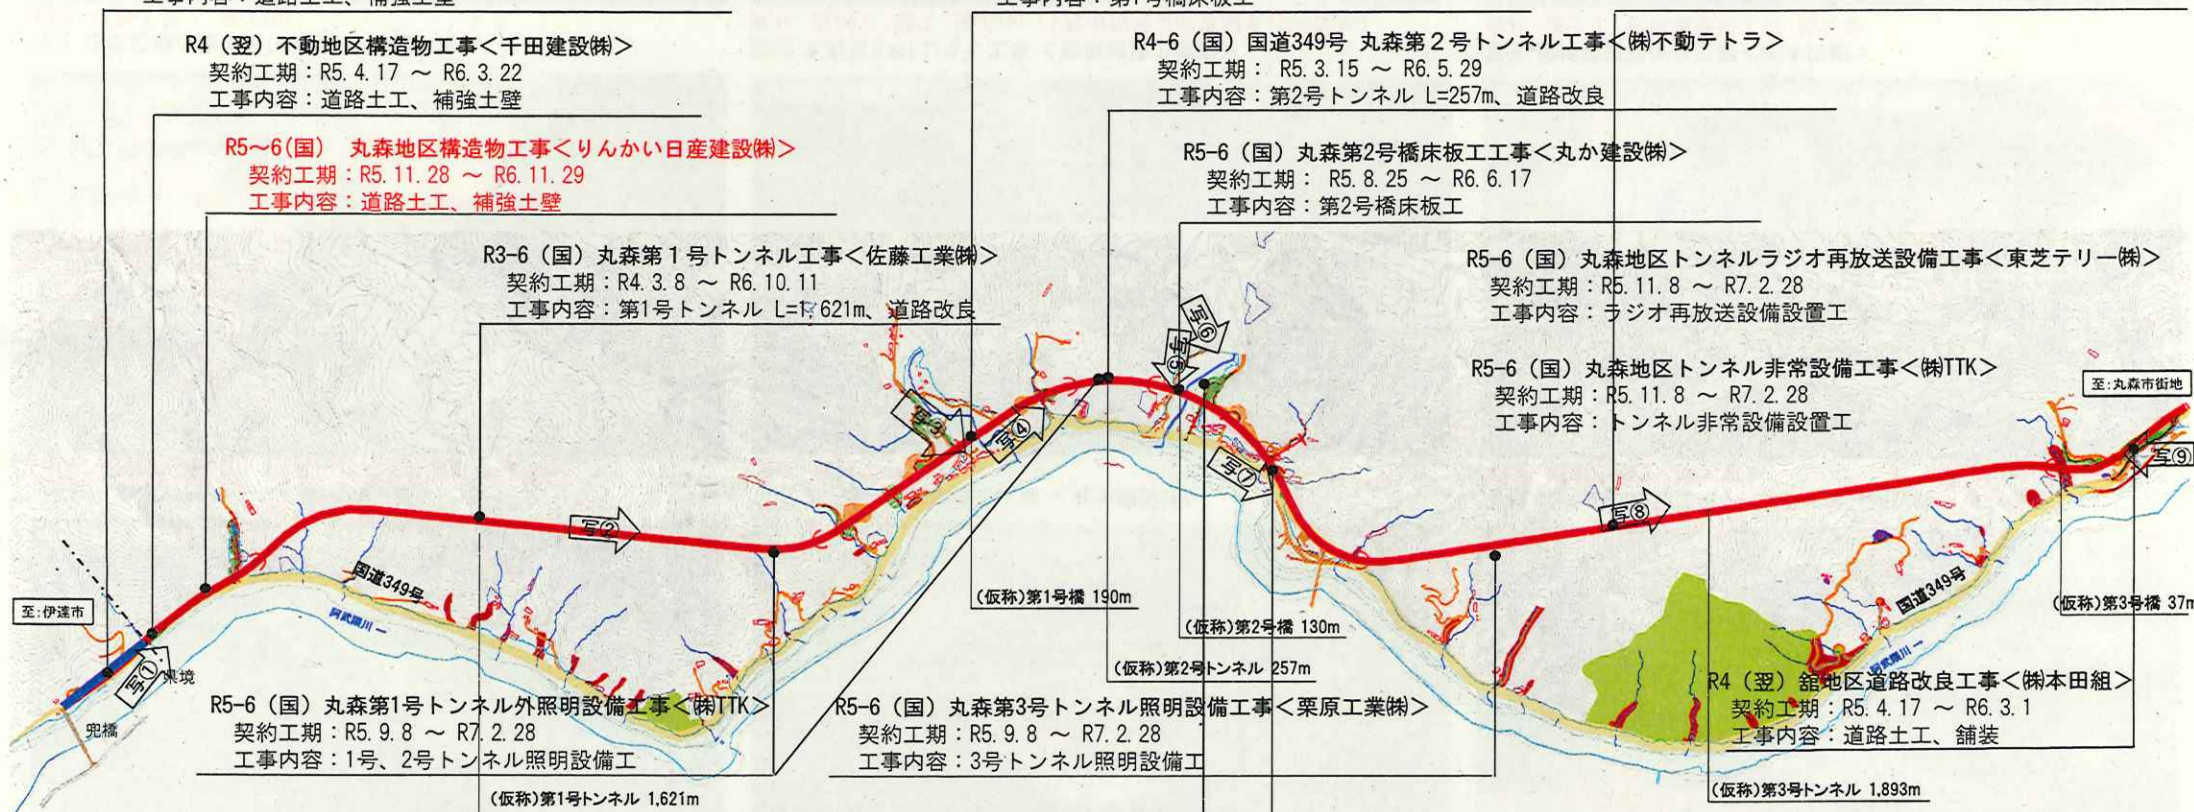

国道349号 山側への別ルート(別線整備) 現場状況写真

写① 不動地区構造物工事 <千田建設㈱>

現在 補強土壁工 施工中



伊達市側(起点側)から丸森市街地側(終点側)を望む

写② 丸森第1号トンネル工事 <佐藤工業㈱>

現在 掘削工、覆工 施工中 (1月中旬時点の掘削長:約1,070m)



伊達市側(起点側)から見たトンネル掘削坑内

写③ 丸森第1号橋床板工事 <熱海建設㈱>

現在 床版工 施工中



川側から山側を望む

写④ 丸森第2号トンネル工事 <㈱不動テトラ>

現在 掘削工 施工中 (1月中旬時点の掘削長:約50m)



伊達市側(起点側)から丸森市街地側(終点側)を望む

写⑤ 丸森第2号橋床板工事 <丸か建設㈱>

現在 床版工 施工中



山側から川側を望む

写⑥ 沼地区構造物工事(その1) <熱海建設㈱>

現在 補強土壁工 施工中



伊達市側(起点側)から丸森市街地側(終点側)を望む

写⑦ 沼地区構造物工事(その2) <㈱橋本店>

現在 補強土壁工 施工中



伊達市側(起点側)から丸森市街地側(終点側)を望む

写⑧ 丸森第3号トンネル工事 <前田建設工業㈱>

現在 掘削工、覆工 施工中 (1月中旬時点の掘削長:約980m)



伊達市側(起点側)から見たトンネル掘削坑内

写⑨ 館地区道路改良工事 <㈱本田組>

現在 盛土工、排水構造物等 施工中



丸森市街地側(終点側)から伊達市側(起点側)を望む
