


丸森町災害復旧事業の進捗状況について

R6.3末


<道路・橋梁・河川・農地・農業施設・林道・山地>

復旧事業種別	工事箇所数 (災害査定箇所に基づく)	発注済み 箇所数	完了 箇所数	着工率	完了率	完了予定年度
道路・橋梁（町管理）	247	247	235	100.0%	95.1%	令和6年度
河川（町管理）	153	153	149	100.0%	97.4%	令和6年度
農地	274	274	232	100.0%	84.7%	令和6年度
農業施設（農道含む）	332	332	259	100.0%	78.0%	令和6年度
林道	97	97	96	100.0%	99.0%	令和6年度
山地	17	17	17	100.0%	100.0%	令和3年度
合 計	1,120	1,120	988	100.0%	88.2%	

※農地の完了箇所については、部分引き渡しを含む。

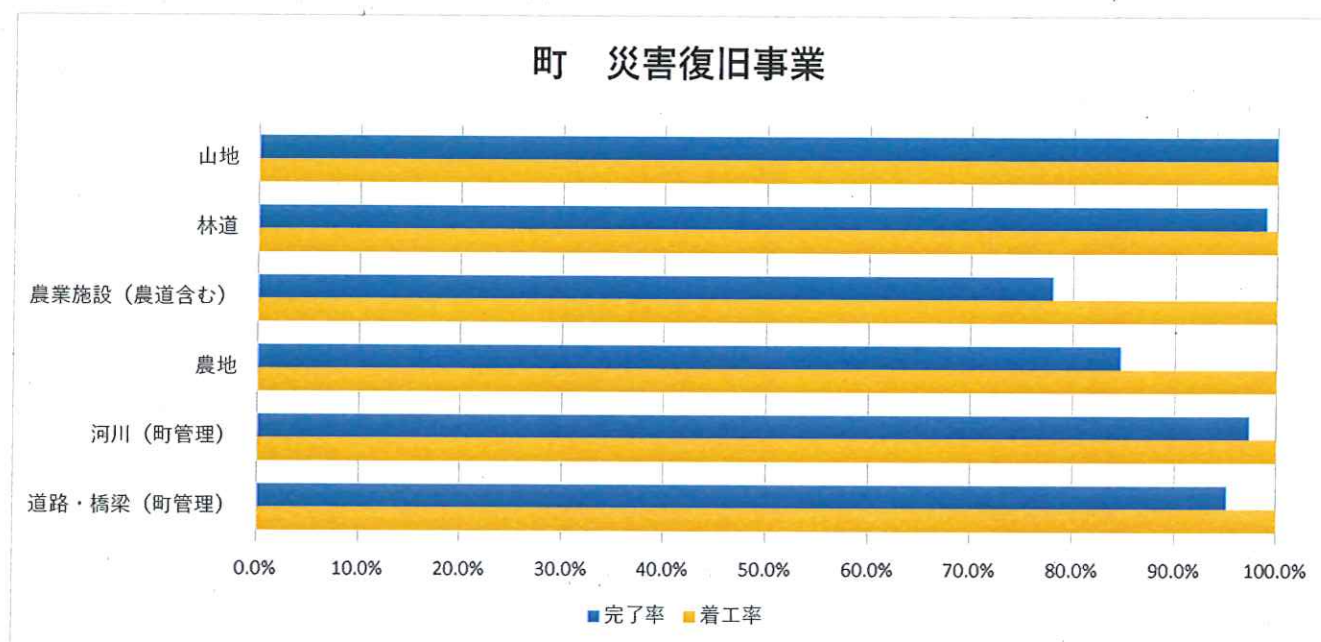

元災第18415号 落合橋（五福谷北山線）

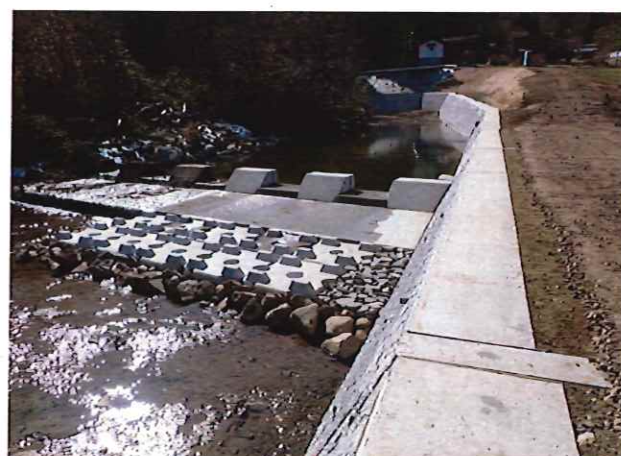


9-2148 鷺ノ平頭首工

宮城県
伊具郡 丸森町

補助災

令和元年災 令和6年度 施工箇所位置図（公共土木施設）

凡 例	
×	河川災
○	道路災
△	橋梁災
○	発注ブロック
赤着色	R6年度 発注箇所
青着色	R6年度 完成箇所

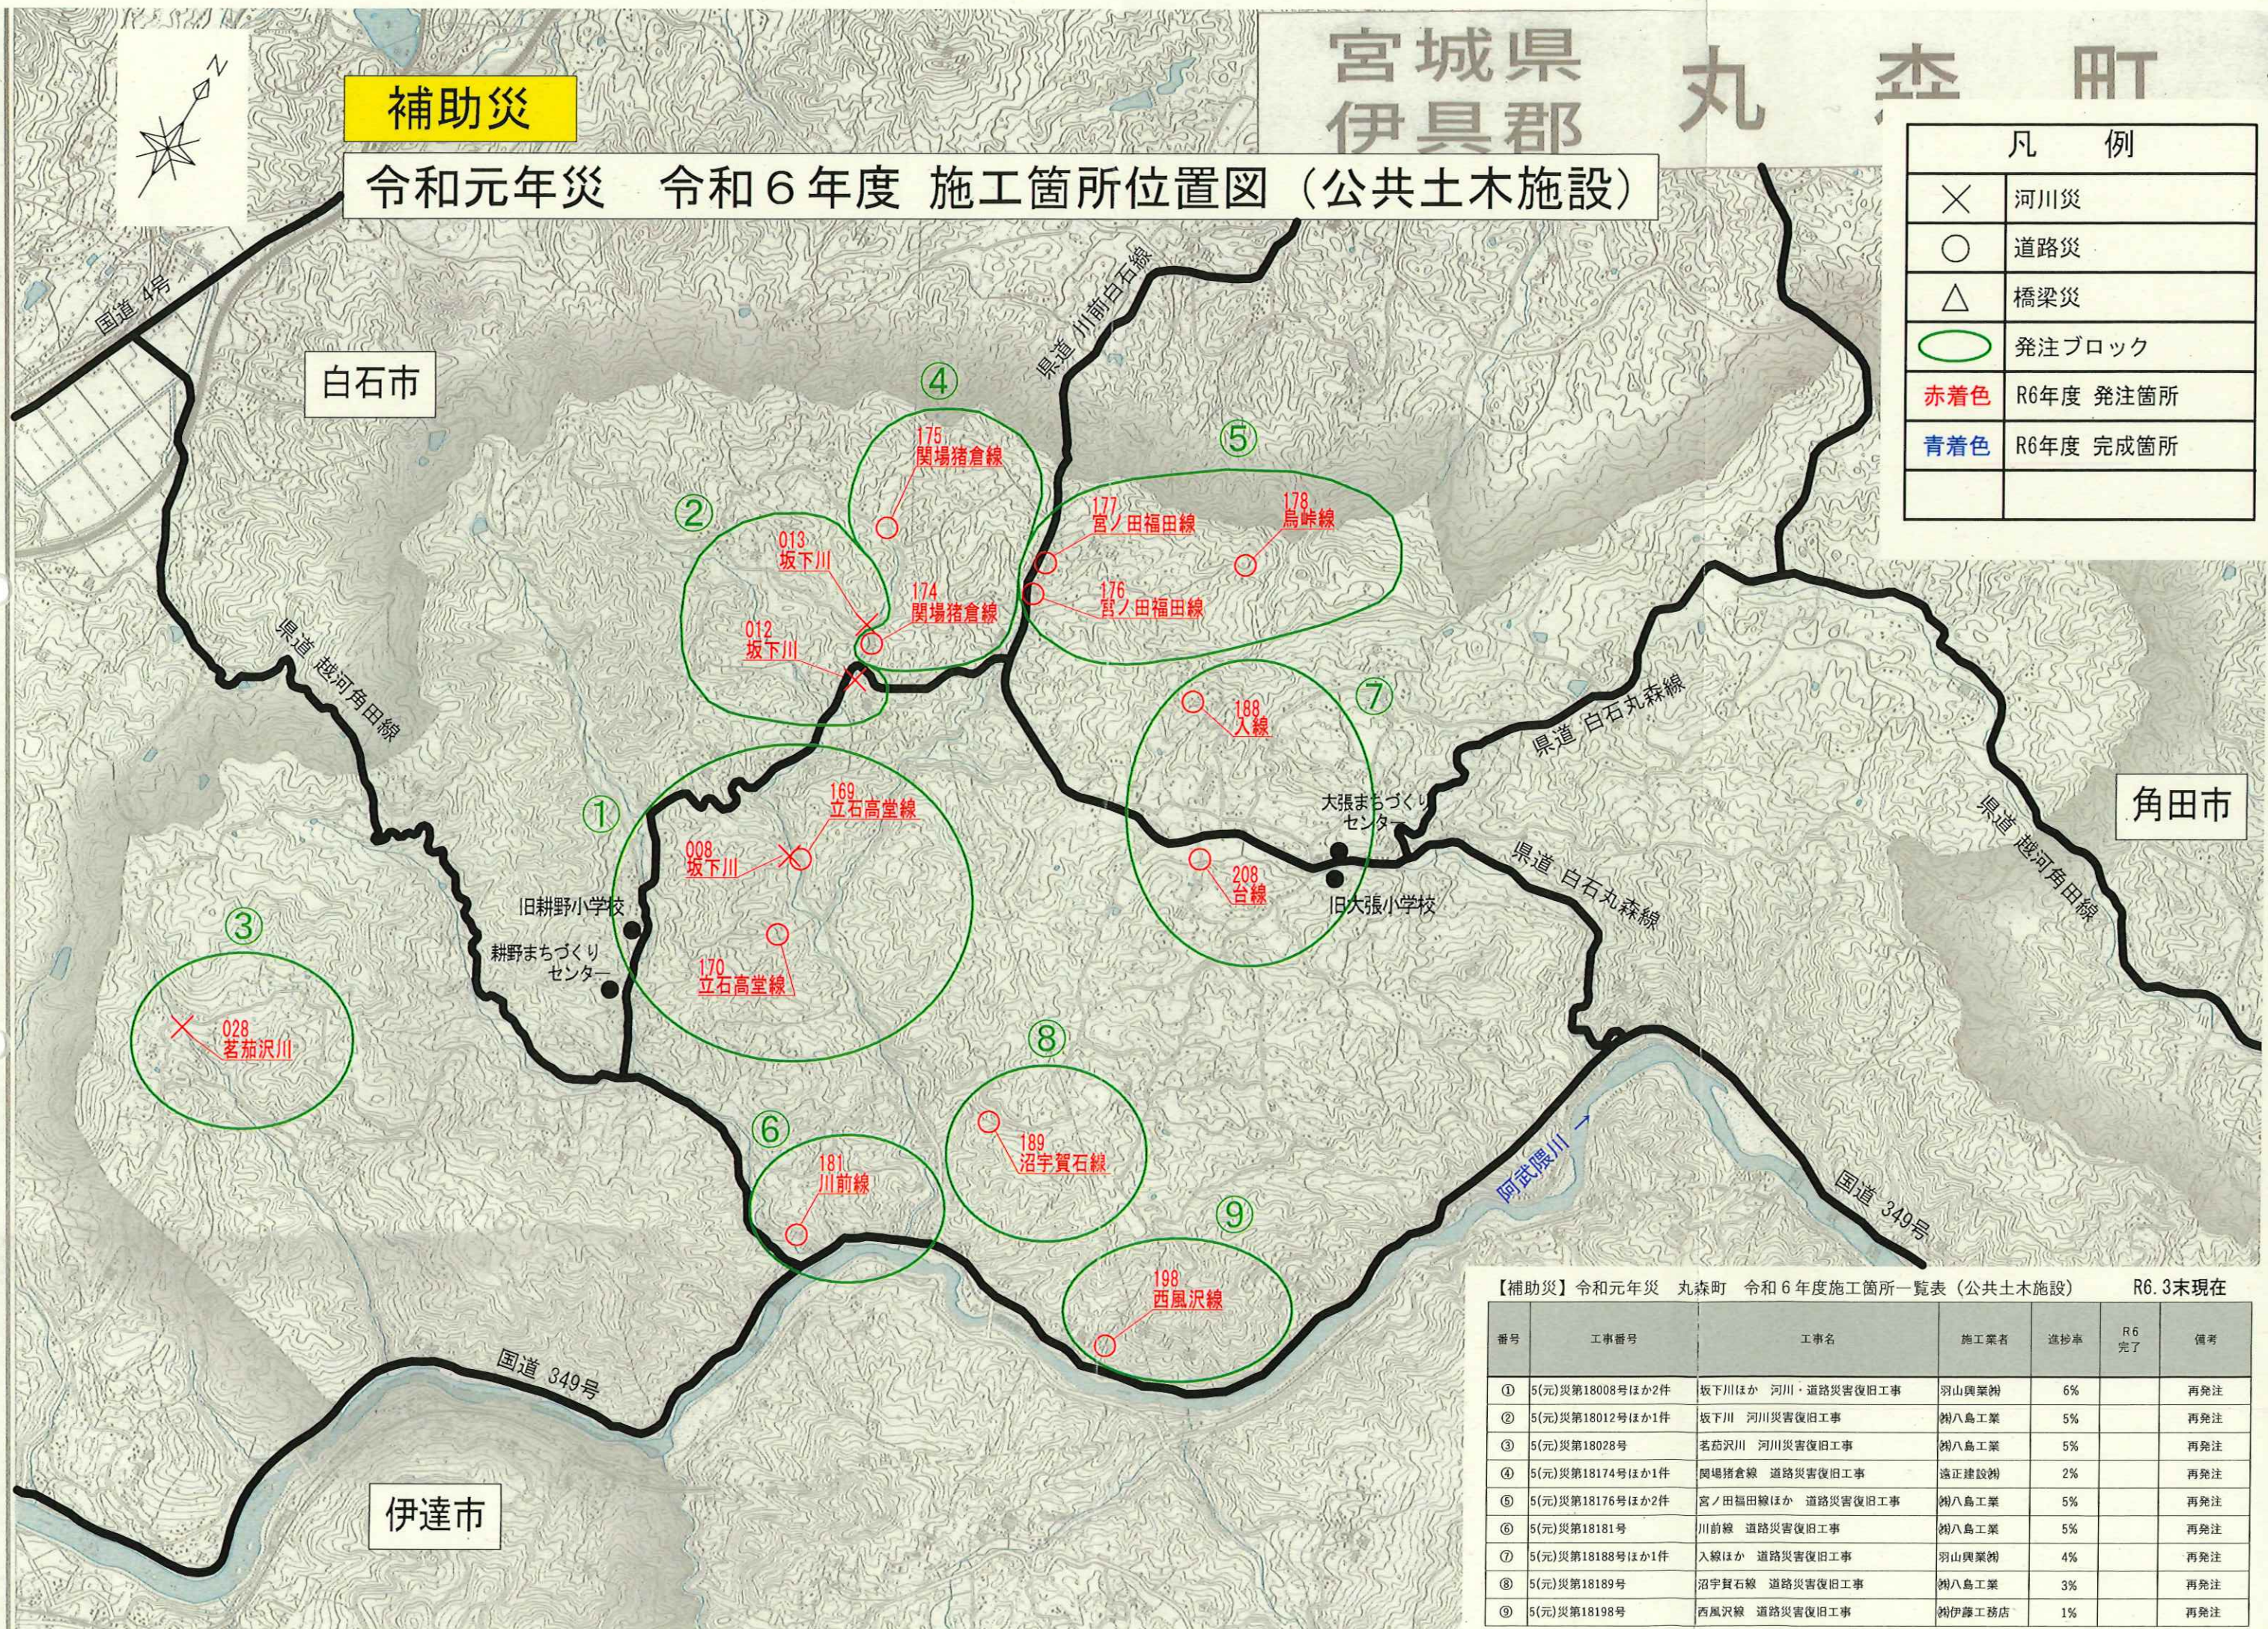


【補助災】令和元年災 丸森町 令和6年度施工箇所一覧表（公共土木施設） R6.3末現在

番号	工事番号	工事名	施工業者	進捗率	R6完了	備考
①	5(元)災第18008号ほか2件	坂下川ほか 河川・道路災害復旧工事	羽山興業㈱	6%		再発注
②	5(元)災第18012号ほか1件	坂下川 河川災害復旧工事	㈱八島工業	5%		再発注
③	5(元)災第18028号	茗茄沢川 河川災害復旧工事	㈱八島工業	5%		再発注
④	5(元)災第18174号ほか1件	関場猪倉線 道路災害復旧工事	遠正建設㈱	2%		再発注
⑤	5(元)災第18176号ほか2件	宮ノ田福田線ほか 道路災害復旧工事	㈱八島工業	5%		再発注
⑥	5(元)災第18181号	川前線 道路災害復旧工事	㈱八島工業	5%		再発注
⑦	5(元)災第18188号ほか1件	入線ほか 道路災害復旧工事	羽山興業㈱	4%		再発注
⑧	5(元)災第18189号	沼宇賀石線 道路災害復旧工事	㈱八島工業	3%		再発注
⑨	5(元)災第18198号	西風沢線 道路災害復旧工事	㈱伊藤工務店	1%		再発注


町単災

令和元年度 令和6年度 施工箇所位置図 【公共土木施設】

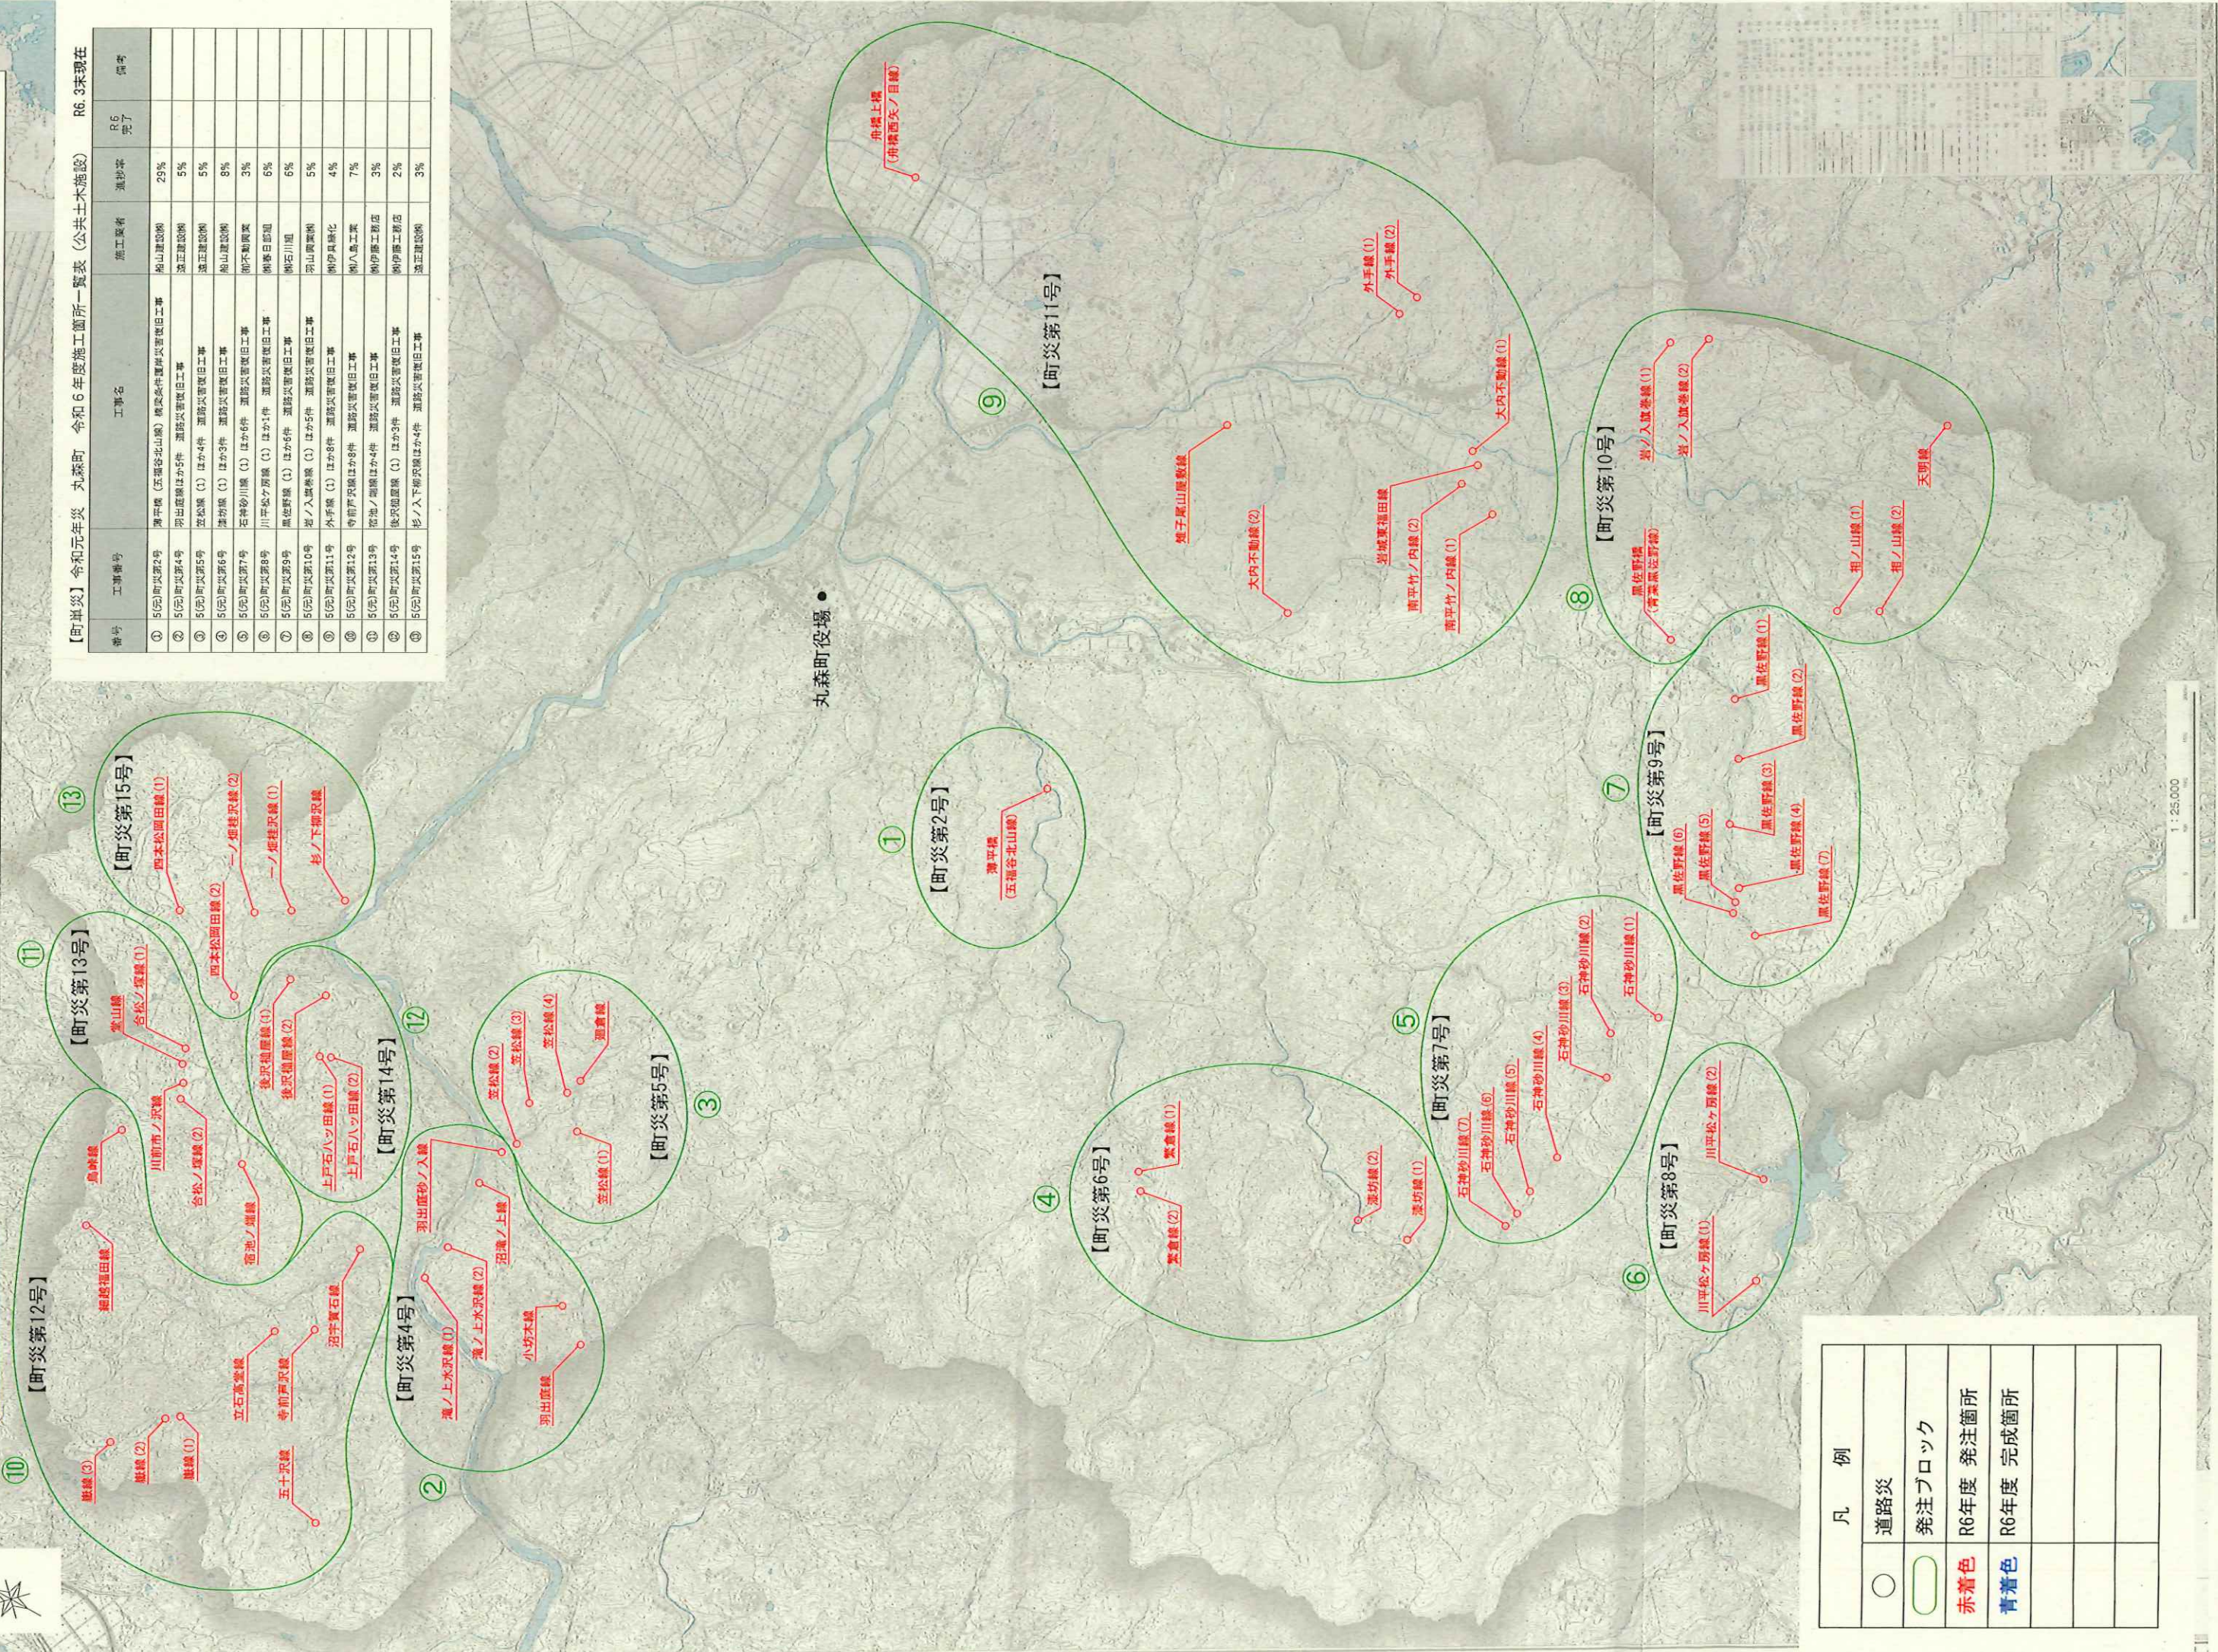

凡 例	
○	道路災
○	発注ブロック
赤着色	R6年度 発注箇所
青着色	R6年度 完成箇所

【町単災】令和元年度 丸森町 令和6年度施工箇所一覧表（公共土木施設） R6.3未現在					
番号	工事番号	工事名	施工業者	進捗率	R6完了
①	5(元)町災第2号	湯平橋（五福谷北山線）補修工事（管線災害復旧工事）	船山建設㈱	29%	
②	5(元)町災第4号	羽出産前ほか5件 道路災害復旧工事	湯平建設㈱	5%	
③	5(元)町災第5号	笠松線（1）ほか4件 道路災害復旧工事	湯平建設㈱	5%	
④	5(元)町災第6号	湯平線（1）ほか3件 道路災害復旧工事	船山建設㈱	8%	
⑤	5(元)町災第7号	石神砂川線（1）ほか6件 道路災害復旧工事	羽不動興業	3%	
⑥	5(元)町災第8号	川平砂ヶ原線（1）ほか1件 道路災害復旧工事	御幸日郎組	6%	
⑦	5(元)町災第9号	黒佐野線（1）ほか5件 道路災害復旧工事	船石川組	6%	
⑧	5(元)町災第10号	堤ノ入線（1）ほか5件 道路災害復旧工事	羽山興業㈱	5%	
⑨	5(元)町災第11号	湯平線（1）ほか8件 道路災害復旧工事	御伊具緑化	4%	
⑩	5(元)町災第12号	菅池ノ端線ほか4件 道路災害復旧工事	御八島工業	7%	
⑪	5(元)町災第13号	菅池ノ端線ほか4件 道路災害復旧工事	御伊藤工務店	3%	
⑫	5(元)町災第14号	後沢線（1）ほか3件 道路災害復旧工事	御伊藤工務店	2%	
⑬	5(元)町災第15号	杉ノ入下柳沢線ほか4件 道路災害復旧工事	湯平建設㈱	3%	

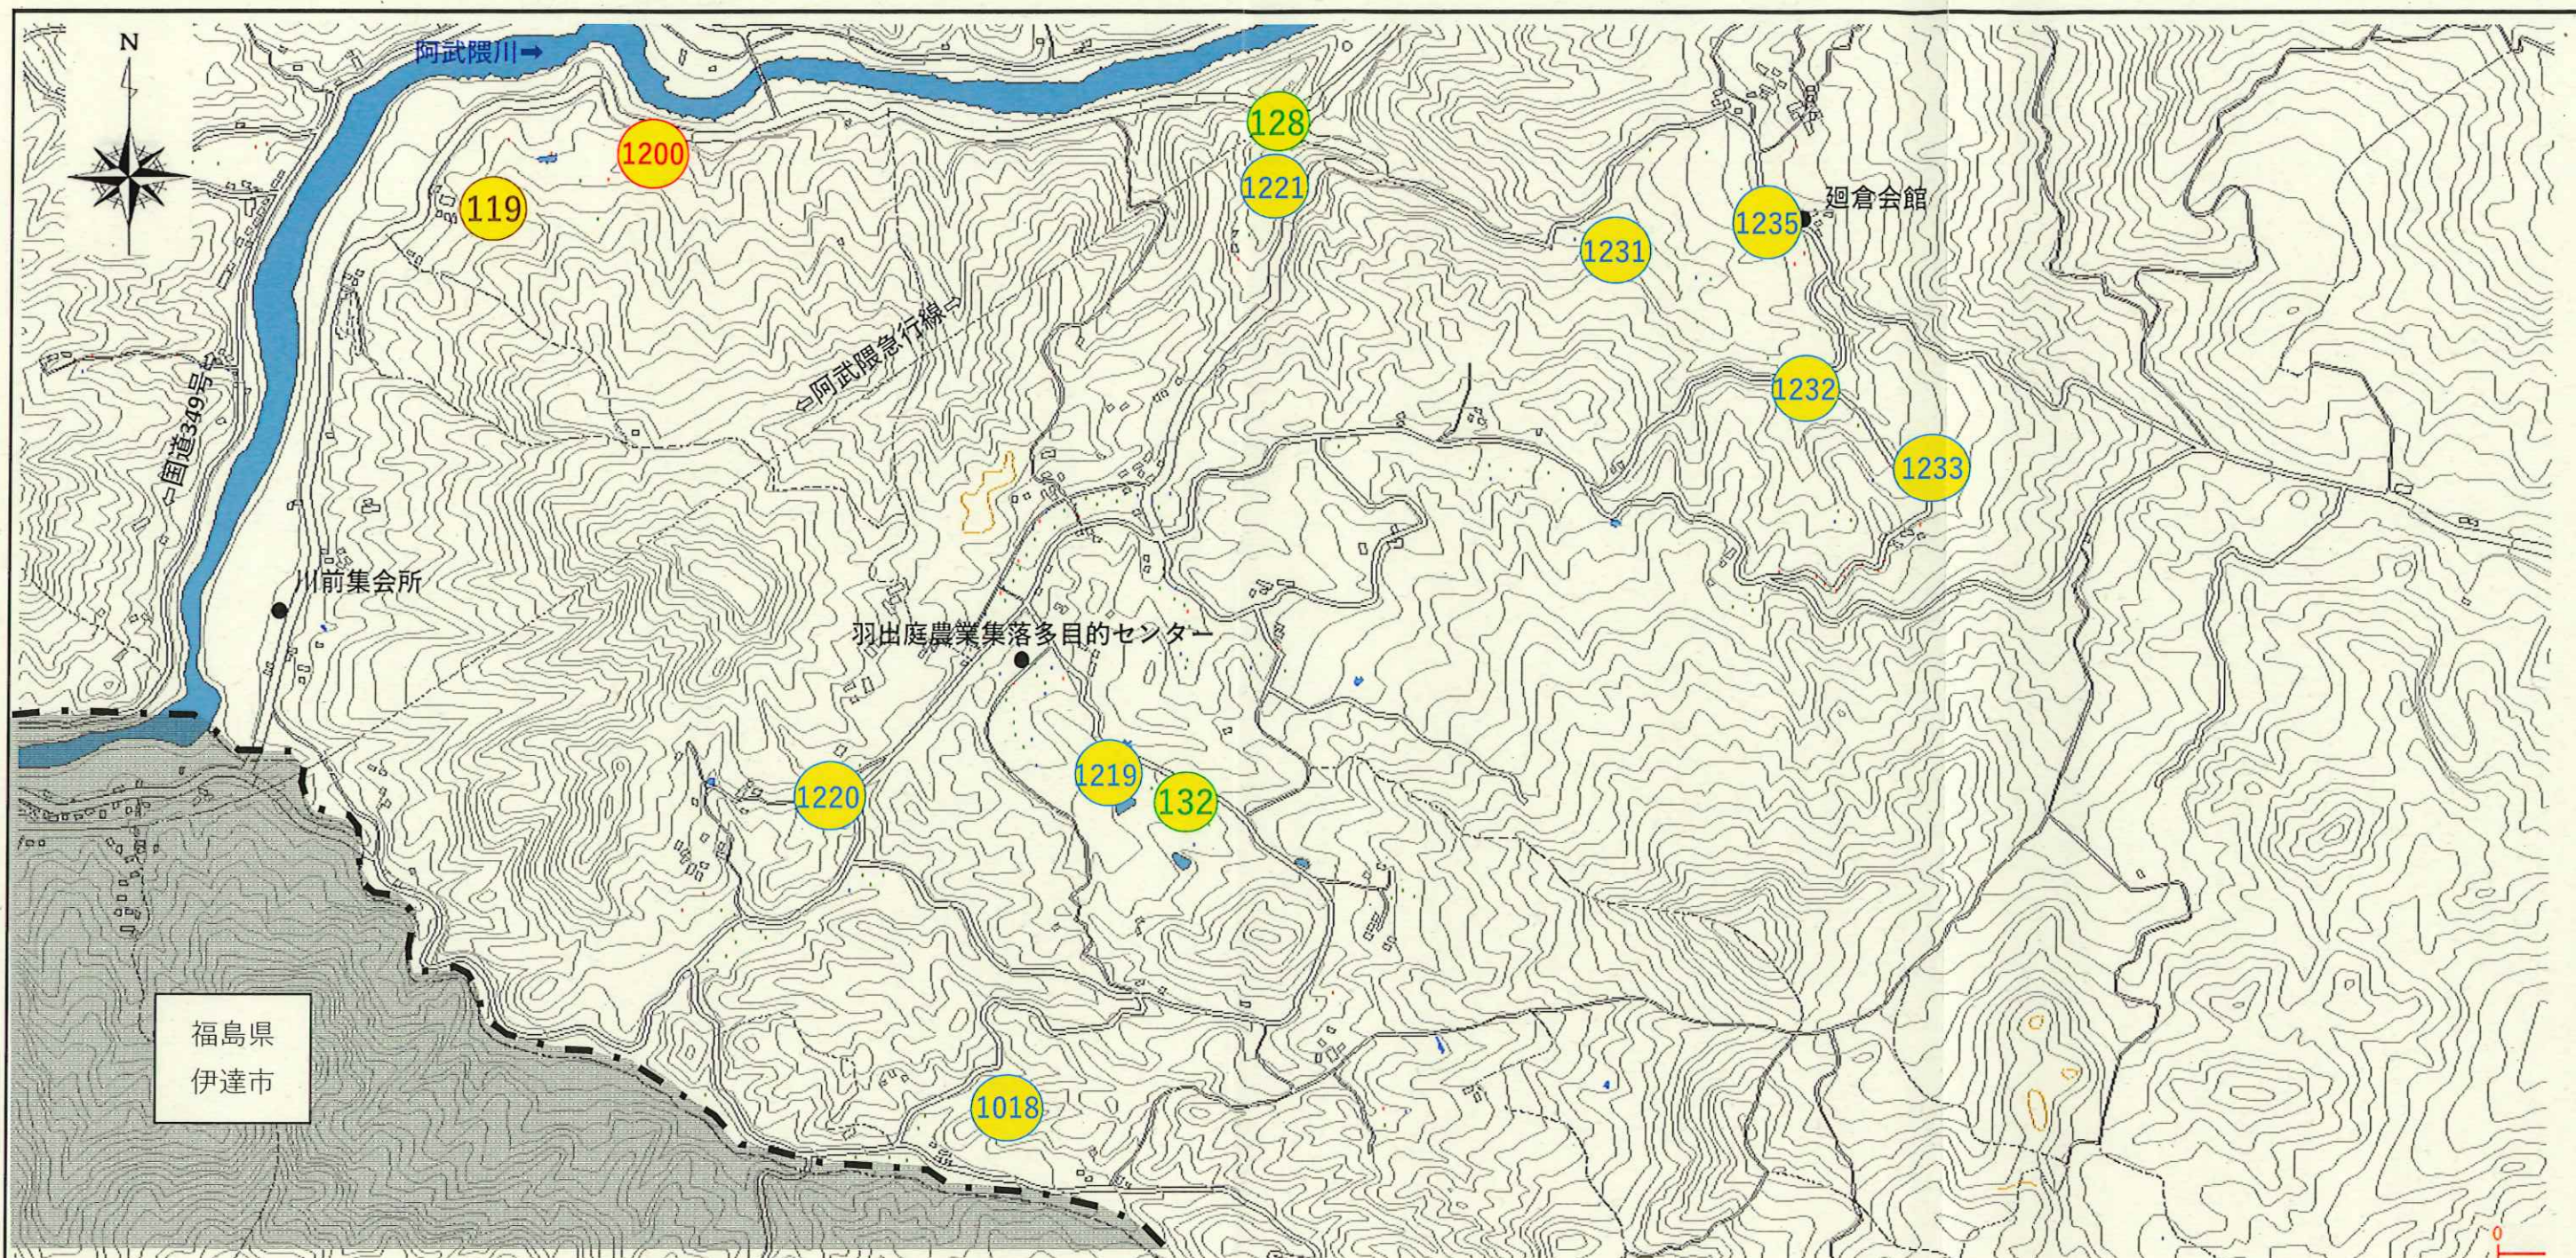


福島県
伊達市

No.	工事番号	工事名	受注者名	進捗率
1	2 (元) 農災第6号ほか210地区・ 2 (元) 災第18003号ほか33件	塩ノ貝地区ほか 災害復旧工事	株式会社 佐々木建設	42.0%

凡例


- 農地 (田)
- 農地 (畑)
- 道路
- 水路

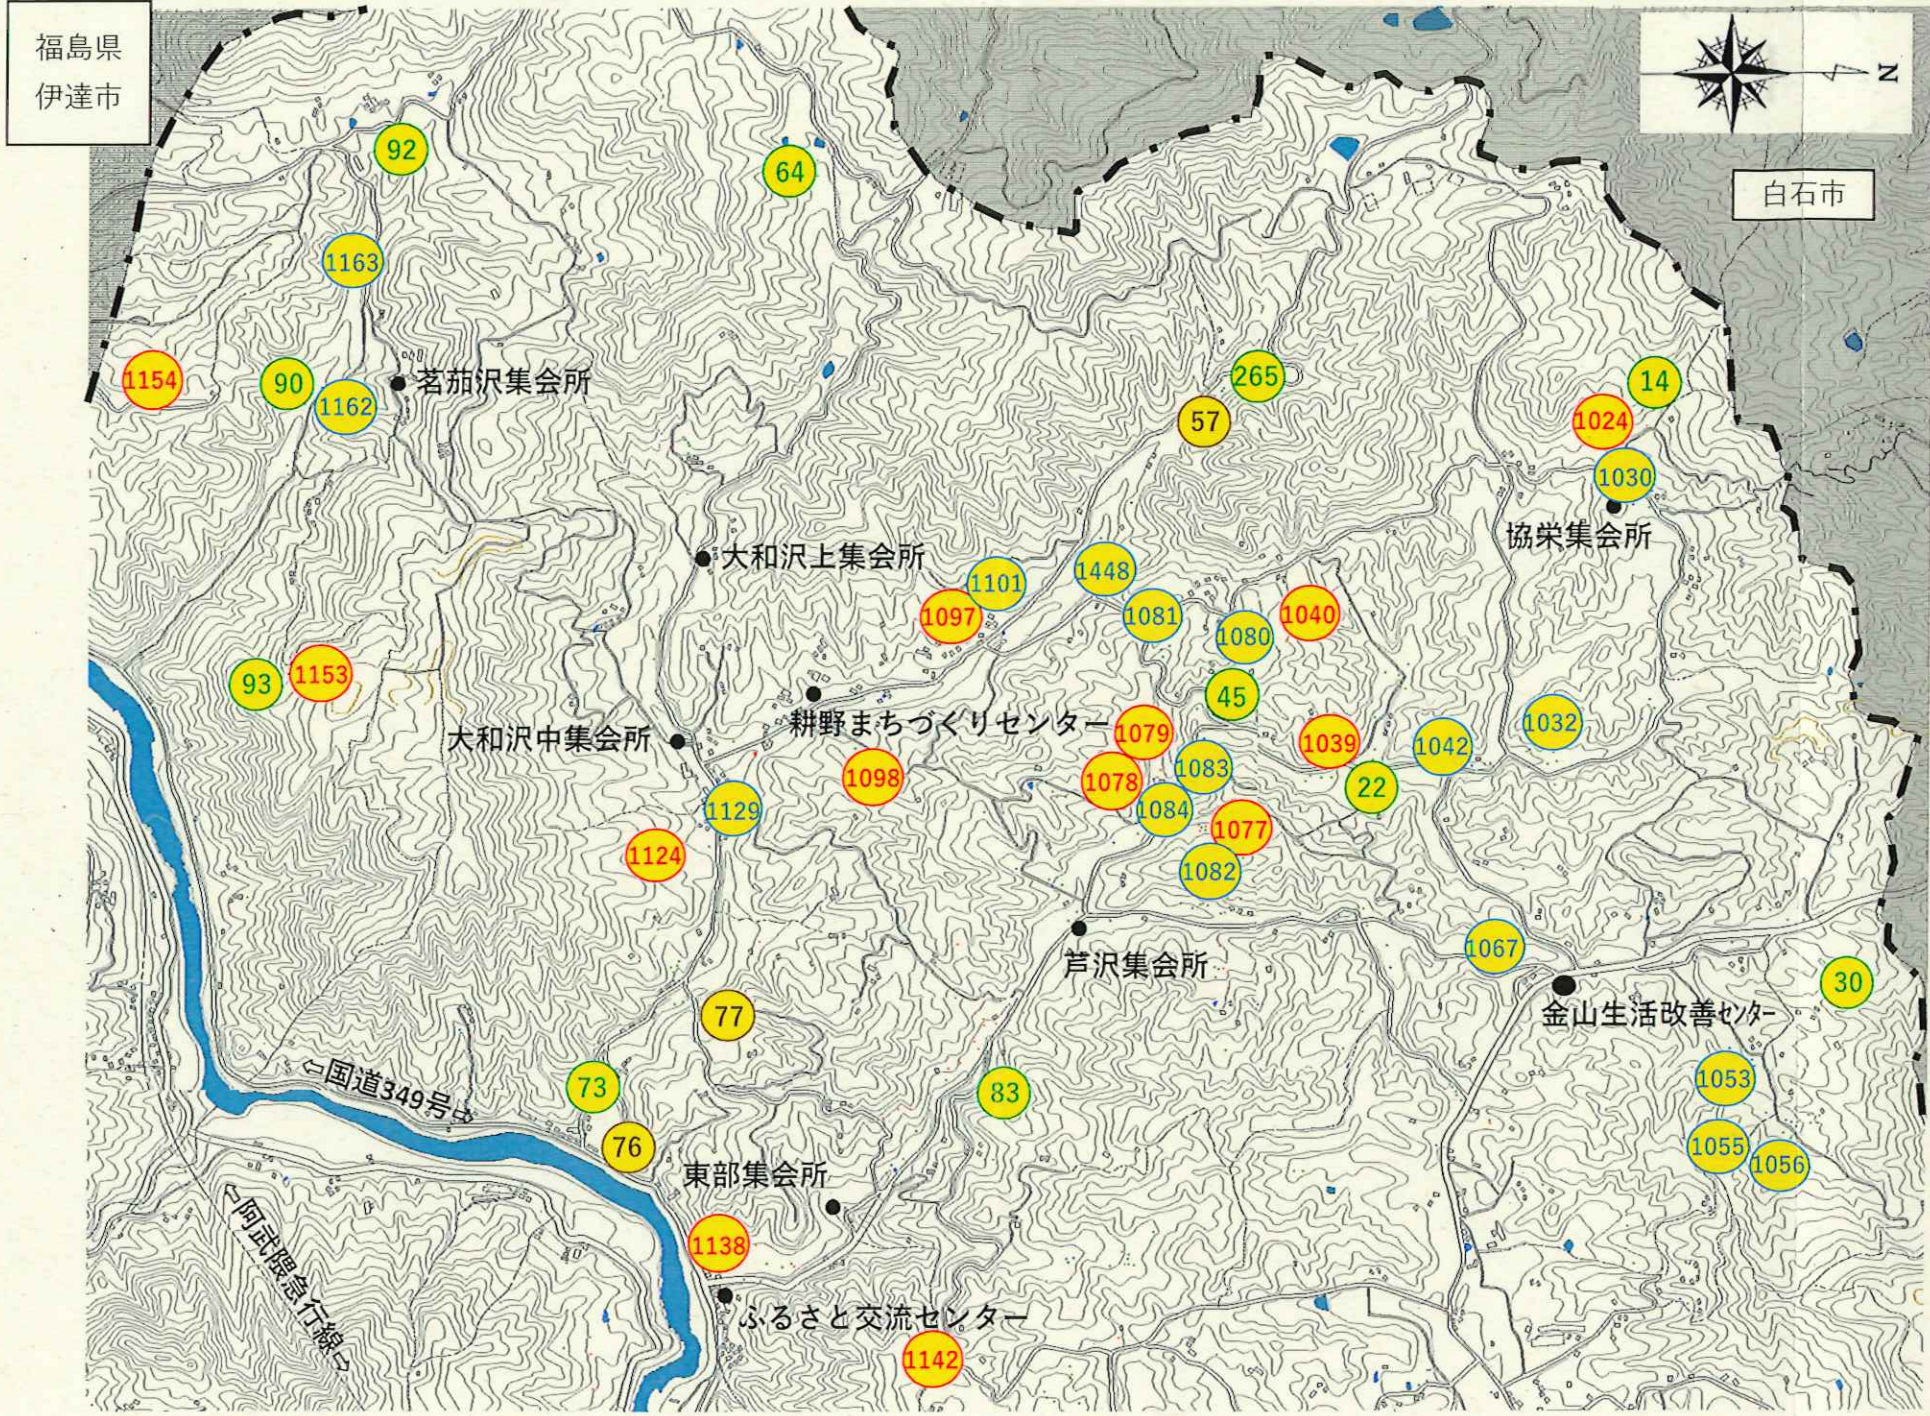

No.	工事番号	工事名	受注者名	進捗率
1	2(元) 農災第6号ほか210地区・ 2(元) 災第18003号ほか33件	塩ノ貝地区ほか 災害復旧工事	株式会社 佐々木建設	42.0%


凡例

- 農地(田)
- 農地(畑)
- 道路
- 水路

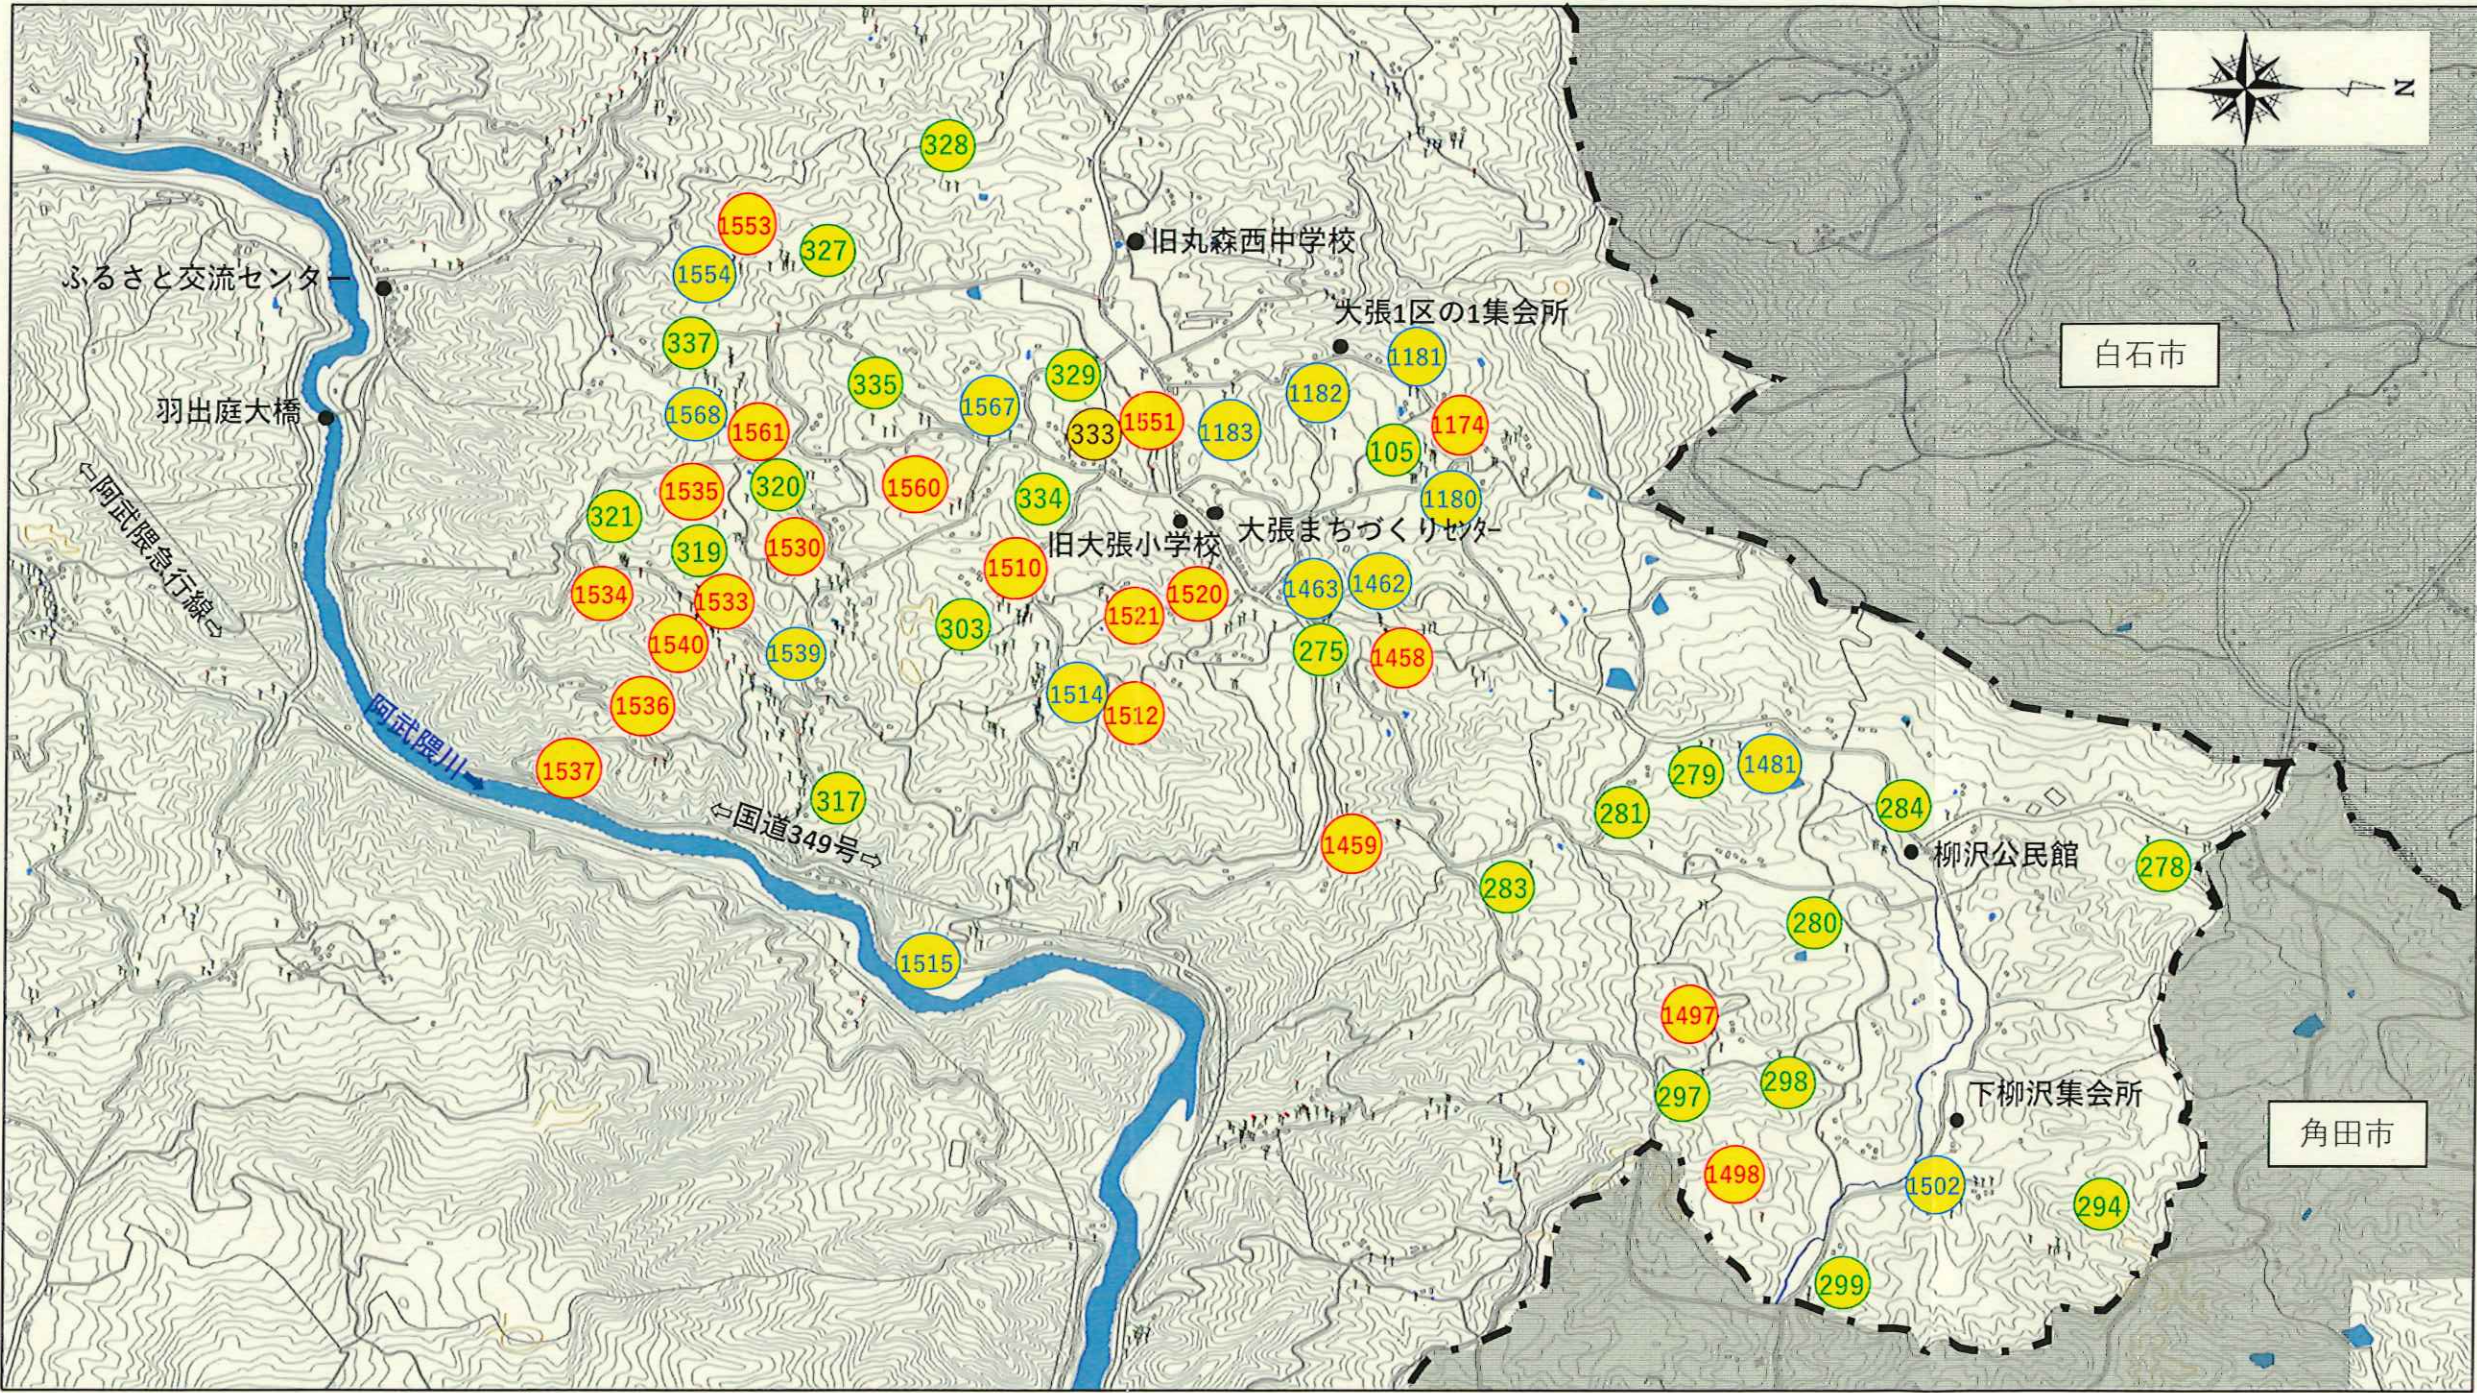

No.	工事番号	工事名	受注者名	進捗率
1	2 (元) 農災第6号ほか210地区・ 2 (元) 災第18003号ほか33件	塩ノ貝地区ほか 災害復旧工事	株式会社 佐々木建設	42.0%

- 凡例
- 農地 (田)
 - 農地 (畑)
 - 道路
 - 水路

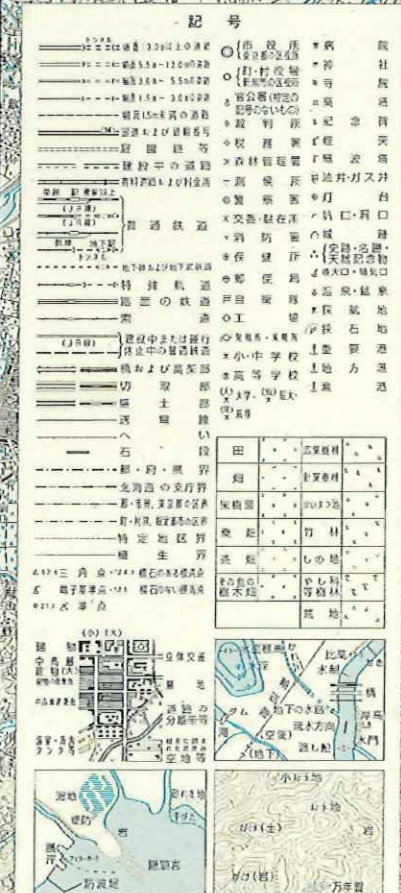

No.	工事番号	工事名	受注者名	進捗率
1	3（元）林災第4号	鷺の平線道路災害復旧工事	株式会社 ノバック	90.0%
